

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## č. S913/2015/542

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Tomášem Pospíšilem,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

**Ing. Pavel Křížek**, technický pracovník HIM, KŘ Šumperk

č. tel.: +420 724 523 659 e-mail: krizek.oi13@lesycr.cz

**Ing. Libor Kejík**, technický pracovník HIM, LS Šternberk

č. tel.: +420 732 766 213, e-mail: kejik.ls129@lesycr.cz, (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Pavel Klimeš**

IČO: 86668692

DIČ: CZ6809040766

místo podnikání: Světlov 2298/100, 785 01 Šternberk

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Klimeš

č. telefonu: +420 732 766 213

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.,

číslo účtu: 167700797/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

### II.

#### Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Opravy a TZ LC – evidenční číslo zakázky S913/2015/542.**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu provedení díla. Při provádění stavebních prací na LC Středová Kamínková probíhá současně těžba dřeva z důvodu kůrovcové kalamity. Touto činností je narušována plynulost a návaznost stavebních prací.

### III. Doba plnění

Termín dokončení díla dle SOD: **30.11.2015**

Prodloužený termín dokončení díla dle SOD: **3.12.2015**

Nově sjednaný termín dokončení díla: **18.12.2015**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne 1.12.2015

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1103/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk



Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

Ve Šternberku, dne ..... 4.12.2015 .....

PAVEL KLÍMEŠ  
Gvňtlov 2298/100  
Šternberk 785 01  
Tel.: 732 766 213  
IČ: 806 68 692, DIČ: CZ806 68 692



Za zhotovitele  
Pavel Klimeš

Přílohy :  
- žádost o sepsání dodatku  
- zápis ve stavebním deníku

Lesy ČR, s.p.  
Krajské ředitelství  
Potoční 22  
787 01 Šumperk  
Česká republika

### Žádost o vystavení dodatku č.1. ke smlouvě o dílo č.S913/2014/542

V souladu se směrnicí 4/2014 Vás tímto žádáme o vystavení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.S913/2014/542 na akci „Opravy a TZ LC“.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla .

Termín dokončení díla dle SoD - 3.12.2015 (původní termín 30.11. 2015, prodloužen vzhledem ke zpožděnému předání stavěniště)  
Požadovaný termín k dokončení díla 18.12.2015

Zdůvodnění : Při provádění stavebních prací na LC Středová Kamínková probíhá současně těžba dřeva z důvodu kůrovcové kalamity. Touto činností je narušována plynulost a návaznost stavebních prací a dochází také k poškození ztuhlých vrstev frakce 0-63mm.

### Souhlasné stanovisko k akci „Opravy a TZ LC“


LS Šternberk souhlasí s prodloužením termínu dokončení díla „Opravy a TZ LC“ ( LC Středová Kamínková, Panelové skládky revír 8, LC Placvara) ke dni 18.12.2015.


Přílohy: Zápisy ze SD z kontrolních dnů ze dne 2.11.2015 a 11.11. 2015, .

S pozdravem

Ve Šternberku dne 30.11.2015

Ing. Jiří Sládek, lesní správce ve Šternberku

  
Lesy České republiky s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1106/9, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesní správa Šternberk  
Světlov 863/60, 785 01 Šternberk

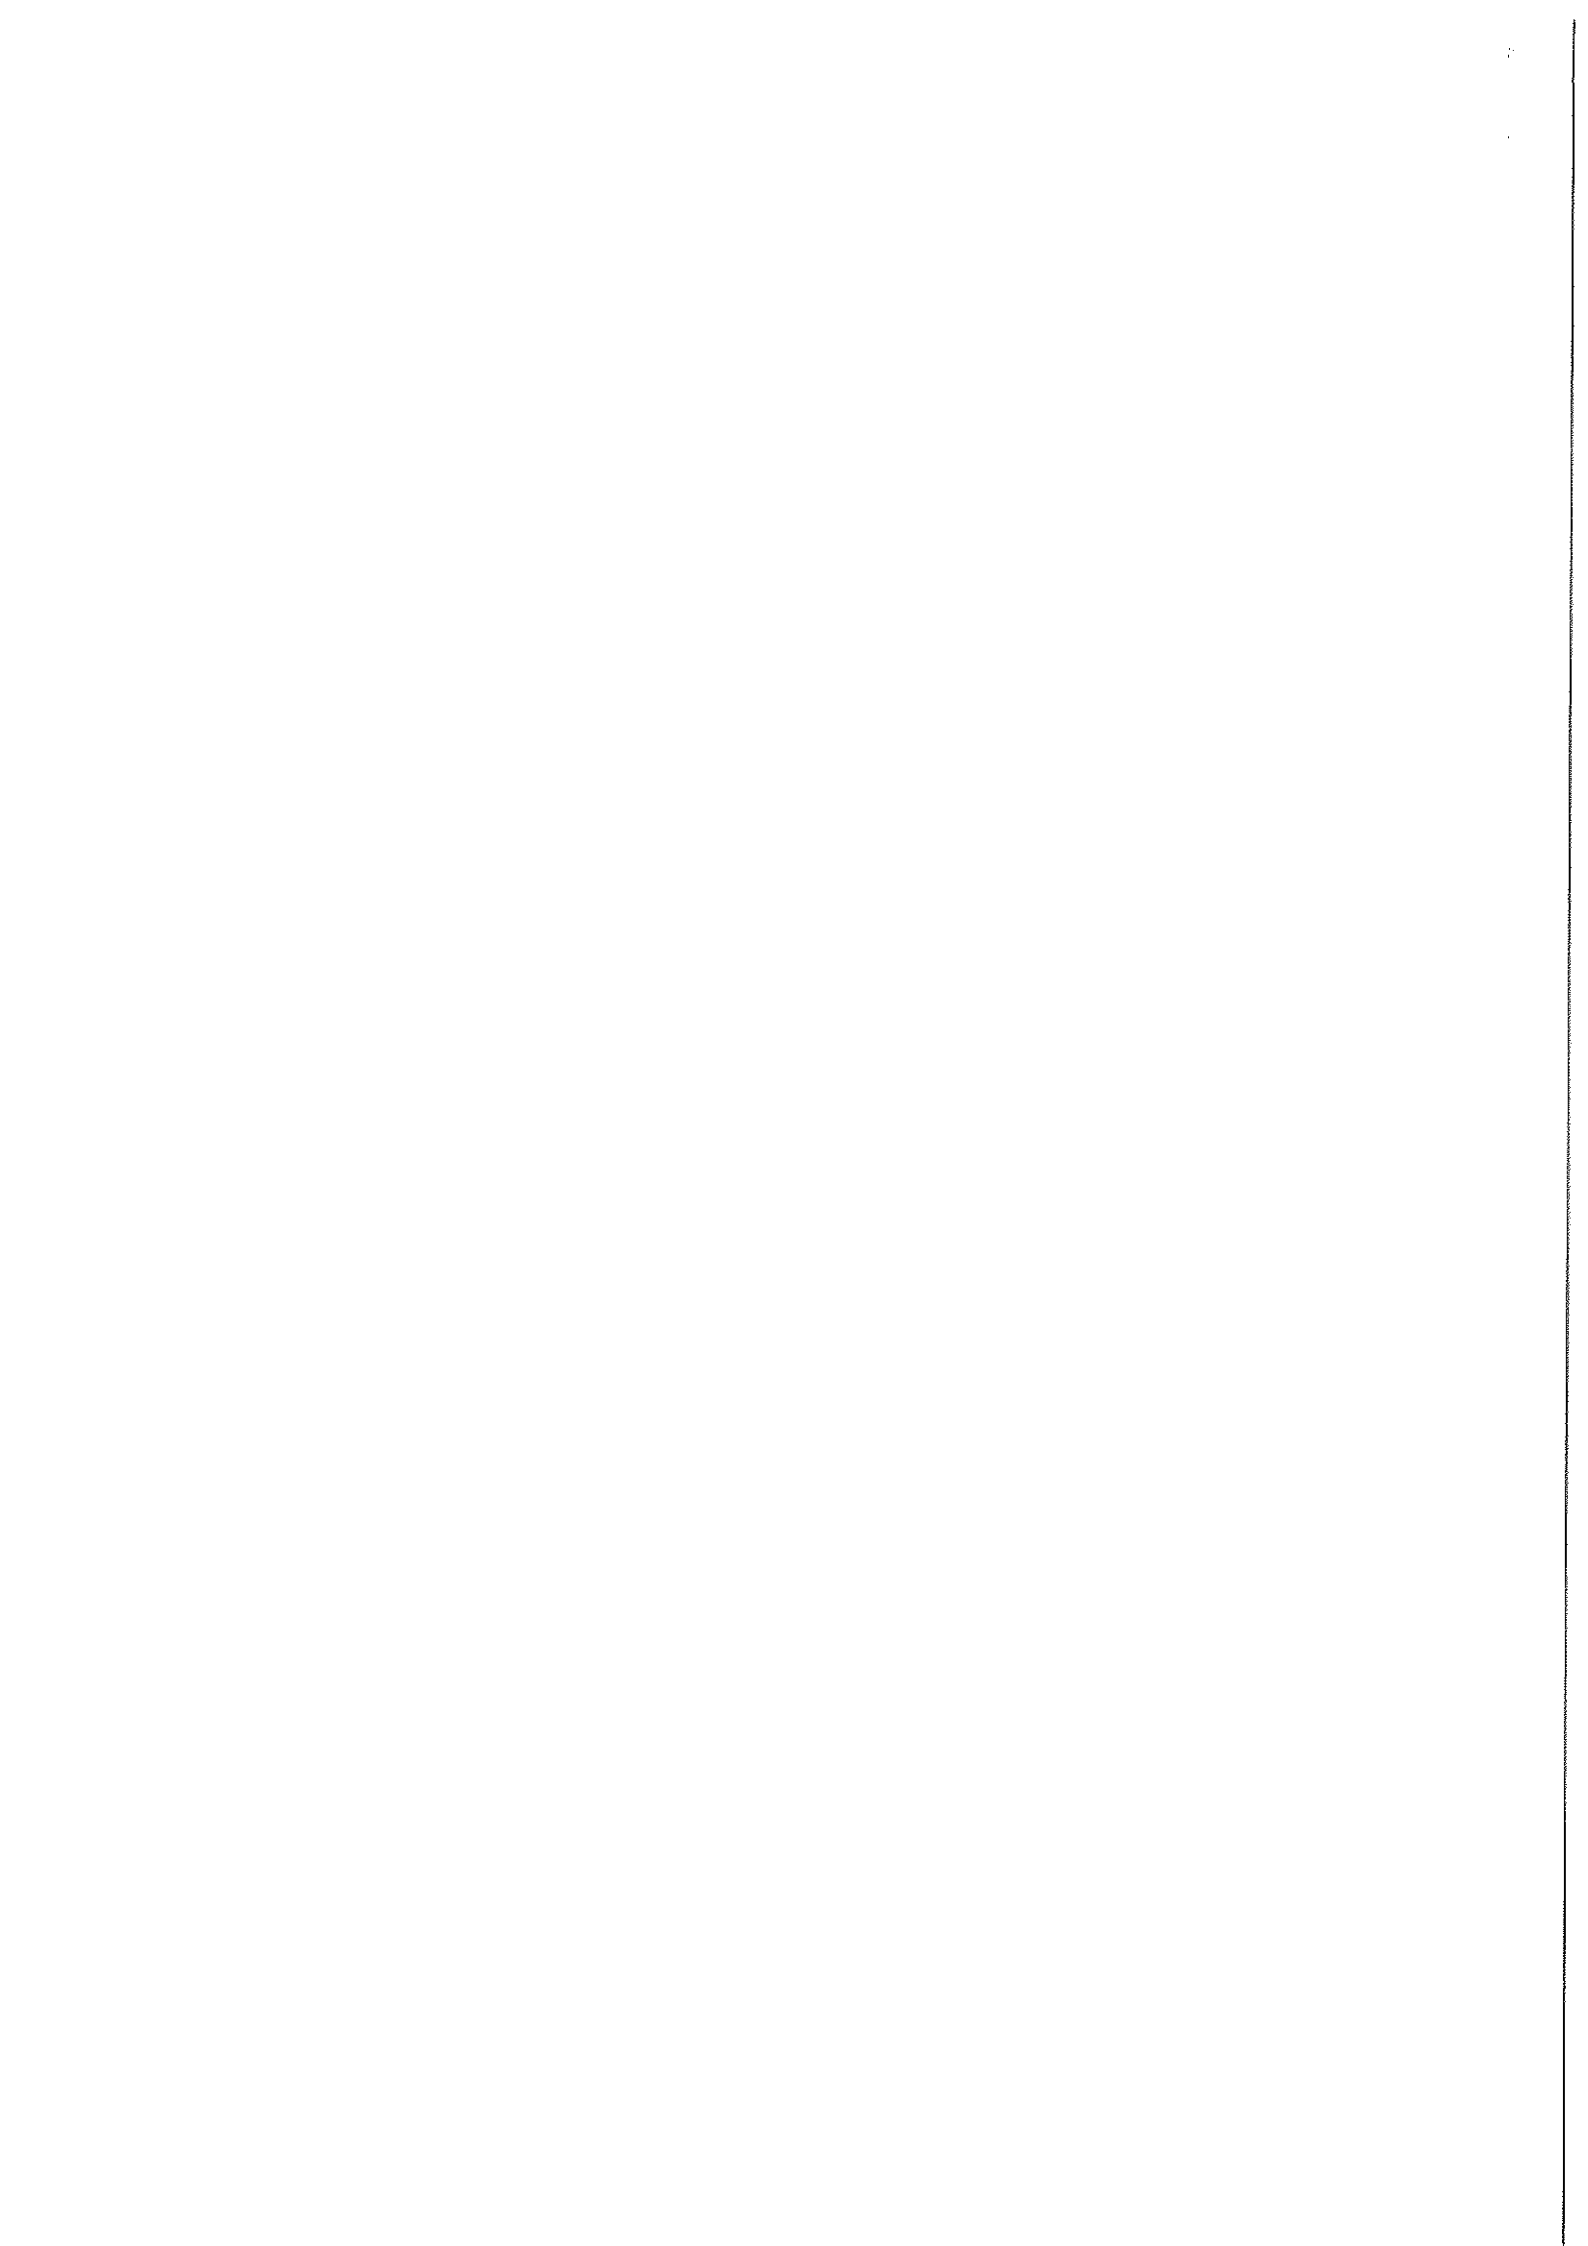

0. Středová Laminková

2.11.2015

POČET PRACOVNÍKŮ: 2x 1x špičák  
 POLVAL V. 1x ŘIDIČ MAČAL P.  
 1x řidič SANDLER D.

POČASÍ Pevná-  
 SNÖ  
 TĚPLOTA +15°C

MAČAL PORA: 6<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> 1M ŘZP  
 TECHNIZACE PRÁCE 1M 771 KRAČNĚ  
 PŘÍPAD ZKATAA SCS 85

Popis prací: DOKONČENÍ ÚPRAV  
 ÚDRŽBY V ÚSEKU DATÁČEK PO  
 ODĚV ŽEŤI. LOKALITĚ AUTOMATICKÉ  
 VOZÍ ŠD DO KOLEJÍ DLE PD.

\* DLEŽITĚ DŮLŽE TAKÉ SPOLEČNĚ  
 KONTROLOVAT DĚL NA MÍSTĚ STAVBY  
 ZA PŘÍTOMNOSTI  
 P. LIMEŠE P. VRÁNY P. PAČEKOVÁ  
 AČ LIROD KŮŽEK

Téma přednášky: tvr. zúžňky  
 a oodi zvětšeni poloměru  
 pro hlubší průhled odvozní  
 soupravy.

Také se přednáška na místě  
 řešila velký pohyb lesní  
 techniky z důvodu károusové  
 kalamity a tudíž nepřístup-  
 nosti stavební techniky na  
 stavbu. stroje vytlačí  
 kolese do nové upravené  
 pláňe a vytlačí ŠD.  
 z kolejí.

Také lesní stroje vytlačí  
 dřevní hmotu přes komun-  
 kaci a tím si ničí.  
 nepomáhají ani zúžňky  
 a dopravní značení zú-  
 žňky ÚDRŽBY a práce na  
 RILNĚI

Podpis: V.S. u. P.

ZA OBJEDNATELE:

