



SMLOUVA O DÍLO

č. 018/S933/2016/016

Dodatek č.2

Akce: LC V Páži Domoušice - rekonstrukce**1.OBJEDNATEL:****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček (technický dozor objednatele), hlavní technický pracovník pro stavební činnost,

tel.: 724 524 906, e-mail: frantisek.havlicek@lesycr.cz

Tomáš Králíček (technický dozor objednatele), technický pracovník pro stavební činnost

tel.: 725 257 836, e-mail: tomas.kralicek@lesycr.cz

Ing. Petra Sojková (technický dozor objednatele), technický pracovník pro stavební činnost

tel.: 702 079 160, e-mail: petra.sojkova@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.ZHOTOVITEL:**PETROM STAVBY, a.s.**

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 20765

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupený: P. Kasper – předseda představenstva, R. Jemečný – místopředseda představenstva, M. Volák – člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jaroslav Štádler

č. telefonu: 474 345 482 e-mail: stadler@petromstavby.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4193102/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo

UZAVŘENÍ SMLOUVY
SMLOUVA O DÍLO
Č. 018/S933/2016/016
Dodatek č. 2

II. Předmět smlouvy

1. Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt a byly projednány na základě kontrolního dne z 14.11.2016:

Doplňuje se o:

Vícepráce požadované objednatelem:

Položka V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

Geodetické práce po výstavbě – zpracování geometrického plánu.....60 000,- Kč

Odůvodnění:

V průběhu dokončení stavby bylo zjištěno, že součástí rozpočtových podkladů není geometrický plán. Vzhledem k tomu, že je nutné ověřit průběh stavby a stavbu řádně zkolaudovat, bude pro potřeby lesní správy, katastrálního úřadu a stavebního úřadu pořízen geometrický plán stavby.

III. Doba plnění

Doplňuje se o:

1. Nový termín dokončení celé stavby do: **20.12.2016**

Odůvodnění:

Z důvodu nutnosti potvrzení geometrického zaměření příslušným katastrálním úřadem dojde k prodloužení lhůty k dokončení stavby.

IV. Cena za dílo

Doplňuje se o :

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované méněpráce a vícepráce ze dne 14.11.2016 byl odsouhlasen objednatelem dne 14.11.2016:

Cena za dílo dle SoD Č. 018/S933/2016/016 včetně dodatku č. 1 a 2 je následující:


LC V Páži Domoušice:	3 012 311,-Kč
Vícepráce:	60 000,-Kč
Celkem:	3 072 311,-Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Kadani, dne:

V Teplicích, dne:

- 6 - 12 - 2016


.....
Za zhotovitele
PĚTR ŠTÁBL
Účelovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, ČR
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ267 69 611
Provozovna:
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADANĚ
tel 474 345 482


.....
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [06]
Lesní územní ústav Prácheňská 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Příloha:
nabídkový rozpočet
zápis ze stavebního deníku ze dne 14.11.2016

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2		
			Datum změny: 14.11.2016		
Název veř. zakázky: LC V Páži Domoušice - rekonstrukce					
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.					
Objednatel: KŘ Teplice – LS Žatec					
Název akce (majetku): 182419	Charakter akce: I -N -IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:		
Popis změny Do rozpočtových nákladů bude přidáno pořízení geometrického zaměření pro možný zápis do katastru nemovitostí a pro potřeby povolovacího řízení stavebním úřadem.					
Zdůvodnění změny: V průběhu dokončení stavby bylo zjištěno, že součástí rozpočtových podkladů není geometrický plán. Vzhledem k tomu, že je nutné ověřit průběh stavby a stavbu řádně zkolaudovat bude pro potřeby lesní správy, katastrálního úřadu a stavebního úřadu pořízen geometrický plán stavby. Z důvodu nutnosti potvrzení geometrického zaměření příslušným katastrálním úřadem dojde k prodloužení lhůty k dokončení stavby s termínem do 20.12.2016.					
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano		
	do ceny:		Termín dokončení (nově) do:	20.12.2016	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,00 Kč N:		Bilance: 3 012 311,- Kč +60 000,- Kč 3 072 311,- Kč bez DPH		
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 666 147,00 Kč N:				
	Konečná celková cena akce po změně			3 072 311,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3 072 311,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Jaroslav Štádlr	Datum: 14.11.2016	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Petra Sojková Tomáš Králíček TP pro SČ, KŘ Teplice	Datum: 14.11.2016	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - Rozpočet - Kopie výpisu ze stavebního deníku					
Poznámka: Termín dokončení stavby dle SoD se posouvá na termín 20.12. 2016 K 30D 01818983120161016					

PETROM STAVBY, a.s.
 Běchovická 701/25, 100 00 PRAHA 10, S117
 IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ2676961
 Provozovna:
 Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAT
 tel. 474 345 482

Lesy České republiky, s.p. (07)
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajská ředitelství Teplice
 Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

POČASÍ: ZATAHOVO + 1+5°C

14. 11. 2016


PRAC. DOBA: M¹⁰ - 16⁰⁰

STAV: THP STADLER, LIBOR DUNDE, VACLAV SAHA

STROJE: TRANSORACK

PRÁCE: FILÁLNÍ TĚŽBY ÚPRAVY

KRAVLC A SKLÁSKOVÍŠT

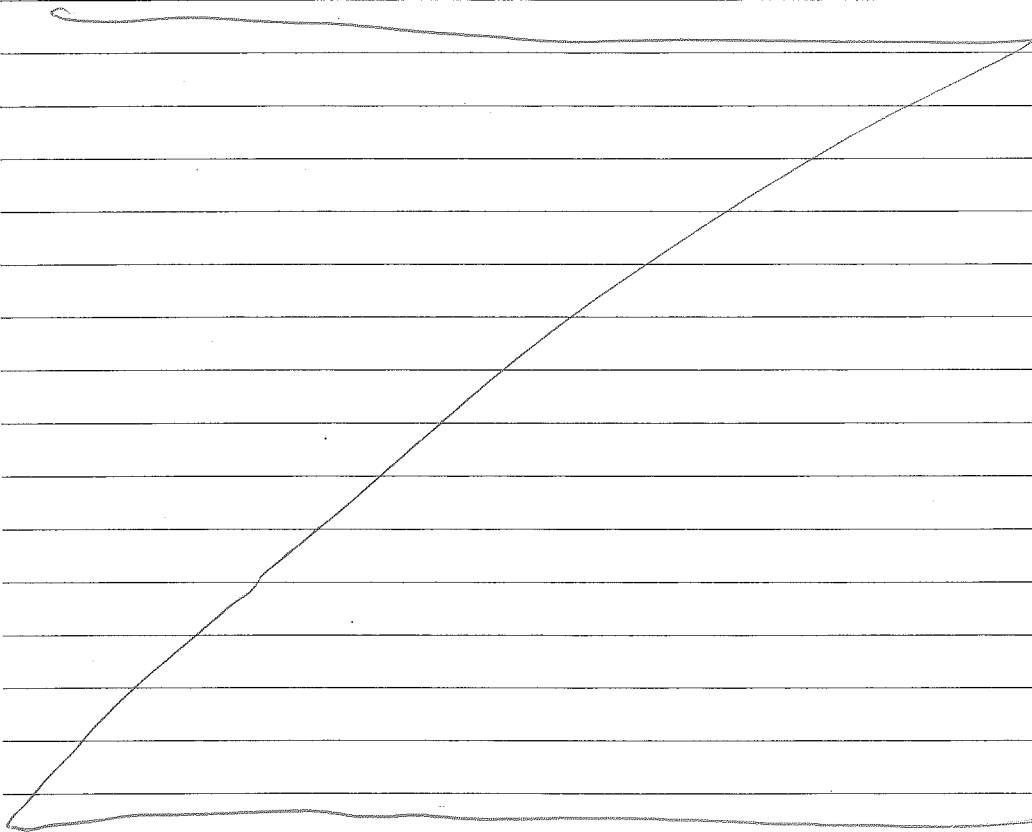

Za měřičem TDS bylo zjištěno, že bude
 zpracován geometrický plán stavby, vzhledem
 ke tomu, že se měří ke předloze příslušného
 speciálního dovozního úřadu. Rovněž je třeba
 pro každou část práce a práci se
 pracovní geometrického měření, měřiče součástí
 rozpočtu práce a předložit plán bude nově
 dostatek č. 2 ke změně v ohled. Geometrický
 plán je nutné mít ověřen od každodávatele
 úřadu a předložit k předložení plánu
 k dokončení celé stavby a termínem do 20. 11. 2016
 ZA TDS: [Signature] ZA ZHOTOVITELE: [Signature]

14. 11. 2016

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Lesní cesta V Páži Domoušice - rekonstrukce - zpracování geometrického plánu
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Radek Jára

V Kadani 14.11.2016

Petr Kasper, předseda představenstva
Roman Jamečný, místopředseda představenstva

PETROM STAVBY, a.s. (1)
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 70, STRAŠNICE
IČ: 267 69 611 DIČ: CZ26769611
Průmyslová
Tušimice č.p. 24, 432 01 KADAN
tel: 74 345 482

14.11.2016
Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Páží, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenkého 2874/1, 415 01 Teplice

Zakázka:

Lesní cesta V Páži Domoušice - rekonstrukce - zpracování geometrického plánu

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	60 000		12 600	72 600
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000		12 600	72 600
Celkem (bez DPH)	60 000			
DPH	12 600			
DPH 21 % ze základny: 60 000			12 600	
Celkem (včetně DPH)	72 600	CZK		

PETROM STAVBY, a.s. (1)
Běchovická 701/2B, 100 00 PRAHA 70, STRAŠNICE
IČ: 267 69 611 DIČ: CZ26769611
Průvozovna
Tušimice č.p. 84, 432 01 KADAN
tel. 474 345 482

V Kadani 14.11.2016

Petr Kasper, předseda představenstva
Roman Jamečný, místopředseda představenstva

14.11.2016

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1155/19, Nový Hrádec Králové
500 03 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice -
Dr. Vrbenského 2574/1, 415 01 Teplice

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01										60 000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										60 000
1.	ON	012303000		Geodetické práce po výstavbě - zpracování geometrického plánu	kpl.	1,0	-	1,0	60 000,00	60 000

Lesy České republiky, s.p. [07]
 se sídlem Pátekova 1115, 471 01 Hradec Králové
 501 00 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Teplice
 Dr. Vrbenského 2574/1, 415 01 Teplice

14. 11. 2016
